



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie



UNIVERSITE DE LOME

CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL
SUR LES SCIENCES AVIAIRES

**CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES
AVIAIRES (CERSA)**

**RAPPORT D'EVALUATION DES OFFRES ET
RECOMMANDATION POUR L'ATTRIBUTION
DU MARCHE (CORRIGE)**

Nom du marché :

Mise en place d'un mini-
abattoir de volailles et
accessoires au profit du
CERSA
(AOI n°02/2017/UL/
PRMP/CERSA du
22/03/2017)

Imputation budgétaire/Prêt ou Crédit :

IDA Crédit N° 5424 - TG

11 août 2017

Handwritten signature

Handwritten signature

Table des matières

Préambule	3
A. Généralités	4
Tableau 1 : Identification	4
Tableau 2 : Procédure d'évaluation	5
Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis	6
Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)	7
B. Examen préliminaire	7
Tableau 5 : Examen préliminaire	7
C. Examen détaillé	7
Tableau 6 : Corrections et rabais inconditionnels	8
Tableau 7 : Taux de change	9
Tableau 8A : Conversion monétaire (plusieurs monnaies)	9
Tableau 8B : Conversion monétaire (monnaie unique)	10
Tableau 9 : Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)	11
Classement	11
D. Post qualification	11
E. Attribution	12
Tableau 11 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché	13
Annexe 1 : PV d'ouverture	15
Annexe 2 : Conformité technique	23
Annexe 3 : Demande de clarification et réponse	27

Handwritten signature and notes in blue ink at the bottom of the page.

Préambule

Le Gouvernement de la République Togolaise a obtenu un financement de la Banque mondiale d'un montant de huit millions (8 000 000) de dollars US pour financer la mise en œuvre des activités du Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA) et se propose d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du Marché relatif à la mise en place d'un mini-abattoir de volailles et accessoires au profit du CERSA constitué en un (01) lot.

Dans cette perspective, le Dossier l'appel d'offres international n°02/2017/UL/PRMP/CERSA du 22/03/2017 a été élaboré et publié dans le grand quotidien national Togo presse et sur les site web de la Banque mondiale.

La date limite de remise des offres initialement fixée au 08 mai 2017 à 10 heures TU a été repoussée au mercredi 24 mai 2017 afin de permettre aux soumissionnaires de mieux prendre en compte les modifications apportées aux dossier d'appel d'offres. Un avis de report de la date de remise des offres a ainsi été publié dans le grand quotidien national Togo presse et sur les site web de la Banque mondiale

Le 24 mai 2017, à 10 Heures 00 TU, trois (03) offres ont été reçues. Conformément aux dispositions du dossier d'appel d'offres, les plis ont été ouverts le même jour à partir de 10 heures 30 minutes en présence de la personne responsable des marchés de l'Université de Lomé (UL), de certains membres de la commission de passation des marchés de l'UL, des représentants du CERSA ainsi que ceux des soumissionnaires.

Les séances d'évaluation des offres ont eu lieu dans la salle de réunion du CERSA les 06, 07 et 08 juin 2017.

Ont pris part à ces séances, les membres de la sous-commission mis en place par note de service n°008/UL/CP/PRMP/2017 du 30 mai 2017 :

M. P'KLA Abalo, Membre de la CPMP/UL, Président
M. BALAWIA Atawa N., Spécialiste en passation des marchés, Rapporteur
M. AFO SABI Kasséré, Membre ;
M. COUCHORO, Mawuli, Membre ;
Prof TONA Kokou, Directeur du CERSA, Membre
M. SOEDJEDE Yawovi Agbelenko, Spécialiste en gestion financière, Membre
M. FOFANA Abdel-Nazir, Membre
M. OSSEYI Elolo Sayo, Membre ;
M. KULO Abalo, Membre ;
M. TETEH Ayivi, Membre.

Le présent rapport fait la synthèse de l'évaluation des offres reçues.

A. Généralités

Tableau 1 : Identification

1.1	Nom de l'Autorité contractante	Université de Lomé (UL)
1.2	Imputation budgétaire / n° du prêt/crédit	IDA 54 24-TG
1.3	Date d'entrée en vigueur du prêt/crédit (le cas échéant)	15 Juillet 2015
1.4	Date de clôture du prêt/crédit : (Le cas échéant)	
a)	Initiale	31 Décembre 2018
b)	Modifiée	
1.5	Nom de l'Autorité contractante/ Nom du projet	Université de Lomé/CERSA
1.6	Numéro (d'identification) du marché	AOI n°02/2017/UL/ PRMP/CERSA
1.7	Description du marché	Mise en place d'un mini-abattoir de volailles et accessoires au profit du CERSA
1.8	Estimation prévisionnelle du coût	103 500 000 FCFA
1.9	Méthode de passation des marchés (cocher la mention pertinente)	AON _____ AOI <input checked="" type="checkbox"/> CR _____
1.10	Examen préalable de la DNCMP et/ou du PTF	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non _____
1.11	Préférence en faveur des candidats de droit communautaire (UEMOA) ou des offres comportant des produits d'origine communautaire	Oui _____ Non <input checked="" type="checkbox"/>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Tableau 2 : Procédure d'évaluation

2.1	Avis général / Plan de passation des marchés	
a)	Dates de publication initiale/dernière mise à jour	Sans objet
2.2	Pré qualification, le cas échéant	Sans objet
a)	Nombre d'entreprises pré qualifiées	Sans objet
b)	Date de l'avis de non-objection de la DNCMP et/ ou du PTF	Sans objet
2.3	Avis spécifique de passation des marchés	
a)	Journal des Marchés publics	OUI
b)	Date de publication	Sans objet
c)	Nom d'un journal de diffusion nationale	Togo Presse
d)	Date de publication	23/03/2017
e)	Nom d'une publication internationale	Clientconnection
f)	Date de publication	23/03/2017
2.4	Dossier type d'appel d'offres	AOI n°02/2017/UL/ PRMP/CERSA du 22/03/2017 pour la mise en place d'un mini-abattoir de volailles et accessoires au profit du CERSA
a)	Titre, date de publication	
b)	Date de l'avis de non-objection de la DNCMP et/ou du PTF	17/03/2017
c)	Date de présentation aux candidats	Sans objet
2.5	Nombre d'entreprises ayant reçu des dossiers	Sans objet
2.6	Modifications aux dossiers, [Le cas échéant]	
a)	Indiquer les dates des différentes publications	1. Sans objet _2. _____ 3. _____
b)	Date(s) de l'avis de non-objection de la DNCMP et/ou du PTF [Le cas échéant]	1. Sans objet _2. _____ 3. _____

Ru Akz ay - f re f

Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis

3.1	Date limite de remise des offres	
a)	Date et heure de dépôt initiales	08 mai 2017 à 10 heures 00
b)	Prorogations, le cas échéant	24 mai 2017 à 10 heures 00
3.2	Ouverture des plis	
	Date, heure	24 mai 2017 à 10 heures 30 minutes
3.3	Nombre d'offres soumises	Trois (03)
3.4	Période de validité des offres (N jours)	
a)	Prévue au départ	120 jours
b)	Prorogations, le cas échéant	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)

a) Nom	Identification du soumissionnaire		Prix de l'offre (lu publiquement)		f) Modifications ou commentaires
	b) Ville ou province	c) Pays	d) Monnaie(s)	e) Montant(s) ou %	
STEА	Lomé	Togo	FCFA	111 942 887	-
Groupement KAPI Consult/ENTOTRA	Lomé	Togo	FCFA	98 283 164	-
ECRO BTP	Lomé	Togo	FCFA	93 866 543	-

B. Examen préliminaire

L'examen préliminaire a consisté essentiellement à vérifier la conformité des différentes offres aux exigences administratives et techniques demandées.

Toute offre non conforme pour l'essentiel sera écartée conformément aux dispositions du point 29.4 des IS.

L'examen des différentes offres a permis d'élaborer le Tableau N° 5 ci-après intitulé examen préliminaire :

Tableau 5 : Examen préliminaire

a) Soumissionnaires	b) Vérification	c) Critères de provenance	d) Garantie de l'offre	e) Exhaustivité de l'offre	f) Conformité pour l'essentiel	g) Acceptation pour examen détaillé
STEА	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	OUI
Groupement KAPI Consult/ENTOTRA	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	OUI
ECRO BTP	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	OUI

A l'issue de l'examen préliminaire, les trois (03) offres ont été acceptées pour l'examen détaillé.

C. Examen détaillé

L'examen détaillé a essentiellement consisté :

- A la correction des erreurs de calcul ;
- Aux ajustements apportés au prix pour omissions et rabais offerts.

La synthèse de l'examen détaillé se présente comme suit :

Tableau 6 : Corrections et rabais inconditionnels

a) Soumis sionnaire	Prix de l'offre lu publiquement		Corrections		f) Prix de l'offre corrigé (f = c + d)	Rabais inconditionnels		i) Prix de l'offre corrigé/avec rabais i = (f - h)
	b) Monnaie (s)	c) Montant(s)	d) Erreurs de calcul	e) Sommes provisio nnelles		g) Pourcen tage	h) Montant(s)	
STEA	FCFA	111 942 887	-472 ¹	N/A	111 942 415	0	0	111 942 415
Groupeme nt KAPI Consult/EN TOTRA	FCFA	98 283 164	5 122 567 ²	N/A	103 405 731	0	0	103 405 731
ECRO BTP	FCFA	93 866 543	-826 000 ³	N/A	93 040 543	0	0	93 040 543

¹ La correction apportée à l'offre est due à l'effet des arrondis.

² La correction apportée à l'offre se justifie comme suit :

Item 1.6 : Remblai d'apport : Prix unitaire 8 000 F (Prix en toutes lettres) au lieu de 8 500 F CFA soit une différence de -54339 (8000-8500) x92,1x1,18 ;

Item 4.1 : 93 x 210 (battant simple) : Prix unitaire 9 500 F (Prix en toutes lettres) au lieu de 95 000 F soit une différence de -201780 F (9500-95000) x2x1,18 ;

Erreur de sommation de + 481 440 au sous total 4 ;

Item 7.2 : Glace lavabo : Prix unitaire 12 000 F (prix en toutes lettres) au lieu de 12 500 F, soit une différence de -590 F (12000-12500) x1,18 ;

Coût des services connexes : 4 919 539 FCFA TTC.

³ La correction apportée à l'offre se justifie comme suit :

Item 6.1 : Tubage et filerie du bâtiment : Prix unitaire de 75 000 F (Prix en toutes lettres) au lieu de 750 000 F soit une différence de -796 500 F (75 000-750 000) x1,18 ;

Item 7.9 : Lavabo complet sur console y compris tuyauterie eau froide, eau chaude (de couleur) : Quantité demandé 3 au lieu de 4 soit une différence de -29 500 F (25 000x1,18).

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Tableau 7 : Taux de change

Monnaie utilisée pour l'évaluation des offres : **FCFA**

Taux de change en vigueur le : **Sans objet**

Tableau 8A : Conversion monétaire (plusieurs monnaies)

Monnaie retenue pour l'évaluation : FCFA

a) Soumissionnaire	b) Monnaie(s) de l'offre	c) Prix de l'offre corrigé/rabais compris	d) Taux de change applicable(s)	Monnaie de l'évaluation	
				e) Prix de l'offre e = (c x d)	f) Prix total de l'offre
STEA	FCFA	111 942 415	1	111 942 415	111 942 415
Groupement KAPI Consult/ENTOTRA	FCFA	103 405 731	1	103 405 731	103 405 731
ECRO BTP	FCFA	93 040 543	1	93 040 543	93 040 543

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

Tableau 8B : Conversion monétaire (monnaie unique)
Monnaie retenue pour l'évaluation : ___FCFA___

a) Soumissionnaire	b) Prix de l'offre corrigé/rabais inclus (en la monnaie indiquée)	Composition des paiements				f) Taux de change utilisé par le soumissionnaire	g) Montant en monnaie utilisée pour les paiements (e x f)	h) Taux de change utilisé pour l'évaluation	Monnaie utilisée pour l'évaluation	
		c) Monnaie de paiement	d) Pourcentage du montant total de l'offre	e) Montant en monnaie utilisée pour l'évaluation (e) = (b x d)	i) Prix de l'offre (g x h)				j) Total	
STEA	111 942 415	FCFA	1	111 942 415	1	111 942 415	1	111 942 415	111 942 415	
Groupeement KAPI Consult/ENT OTRA	103 405 731	FCFA	1	103 405 731	1	103 405 731	1	103 405 731	103 405 731	
ECRO BTP	93 040 543	FCFA	1	93 040 543	1	93 040 543	1	93 040 543	93 040 543	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Tableau 9 : Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)

Monnaie retenue pour l'évaluation : _____FCFA_____

a) Soumissionnaires	b) Prix de l'offre corrigé/rabais inclus	c) Ajouts pour omission	d) Ajustements	e) Variations mineures	f) Prix total (f) = (b) + (c) (d) + e
STEA	111 942 415	-	-	-	111 942 415
Groupement KAPI Consult/ENTOTRA	103 405 731	-	-	-	103 405 731
ECRO BTP	93 040 543	-	-	-	93 040 543

Classement

Soumissionnaires	Montant évalué de l'offre TTC (FCFA)	Rang
STEA	111 942 415	3 ^{ème}
Groupement KAPI Consult/ENTOTRA	103 405 731	2 ^{ème}
ECRO BTP	93 040 543	1 ^{er}

D. Post qualification

Critères	Description	STEA	Groupement KAPI Consult/ENTOTRA	ECRO BTP
i) Capacité financière	Avoir réalisé durant les années 2013, 2014 et 2015, un chiffre d'affaire moyen égale au moins à une (01) fois le montant de son offre	Conforme	Conforme	Conforme
	justifier de liquidités et/ou des facilités de crédit au moins égales à 40 000 000 F CFA.	Conforme	Conforme	Conforme
ii) Capacité technique et expérience	Avoir exécuté au moins un (01) marché de nature similaire au cours des cinq (05) dernières années	Conforme	Non conforme	Conforme ¹

¹ Afin de mieux apprécier la pertinence du marché spécifique présenté par le soumissionnaire, une demande de clarification lui a été adressée (voir en annexe). Après examen des informations fournies, la commission d'évaluation des offres a jugé que l'expérience des travaux de construction d'un abattoir de volailles à Avetonou, réalisé par le soumissionnaire ECRO BTP doit être acceptée comme marché similaire en ce qui concerne la partie

Ru Akz 17 09 - e pour p

Critères	Description	STEA	Groupement KAPI Consult/EN TOTRA	ECRO BTP
	Disposer d'une équipe composée d'au moins :			
	o Un (01) Ingénieur génie civil ou équivalent, Directeur des travaux, spécialiste des ouvrages de bâtiment avec au moins 5 ans d'expérience et ayant participé à au moins un marché de construction de nature et complexité similaire	Conforme	Conforme	Conforme
	o Un (01) Technicien supérieur génie civil, Conducteur des travaux, spécialiste des ouvrages de bâtiment ayant au moins 3 ans d'expérience	Conforme	Non conforme	Conforme
	o Un (01) Technicien supérieur génie électrique spécialiste des ouvrages de bâtiment ayant au moins 3 ans d'expérience	Conforme	Conforme	Conforme
	o Un (01) technicien de laboratoire ayant une parfaite connaissance des équipements demandés et ayant au moins trois (03) ans d'expérience	Conforme	Non conforme	Conforme
	Disposer au minimum, le matériel suivant (en propriété ou en location) :			Conforme
	o Une (01) bétonnière	Conforme	Conforme	Conforme
	o Un (01) vibreur	Conforme	Conforme	Conforme
	o Un (01) compacteur manuel	Conforme	Conforme	Conforme
	o Un (01) véhicule de liaison	Conforme	Conforme	Conforme
iii)	Autorisation de fabricant	Fournie	Fournie	Fournie
Qualifié (OUI/NON)		OUI	NON	OUI

E. Attribution

A l'issue de l'analyse et de la comparaison des offres, la sous-commission d'évaluation des offres recommande que le marché soit provisoirement attribué au soumissionnaire **ECRO-BTP** pour un montant TTC de **quatre-vingt-treize millions quarante mille cinq cent quarante-trois (93 040 543) F CFA**, dont l'offre est conforme pour l'essentiel et la moins disante.

travaux de ce marché. Par ailleurs, des investigations ont été faites auprès du fabricant de la chaîne d'abattage ACMA qui a confirmé avoir été contacté par le soumissionnaire avec qui des dispositions pratiques de livraison ont été négociées au cas où il serait attributaire du marché.

12

Tableau 11 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché

1.	Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante		
a)	Nom : ECRO-BTP		
b)	Adresse : 05 BP 284 Lomé , Tél : +228 90 17 69 80/96 16 66 32, email : ecrobt@gmail.com		
2.	Principal (principaux) pays de provenance des fournitures/matériaux : France		
3.	Date envisagée pour la signature du marché (mois, année) : Juillet 2017 Dates prévues pour l'arrivée des fournitures/matériels sur les lieux du projet/pour l'achèvement du projet <u>02</u> (mois)		
		Monnaie(s)	Montant(s) ou %
4.	Prix de l'offre (lu publiquement)	FCFA	93 866 543
5.	Corrections des erreurs	FCFA	-826 000
6.	Rabais	FCFA	0
7.	Autres ajustements	FCFA	0
8.	Marché proposé TTC	FCFA	93 040 543

13

RAPPORT D'EVALUATION DES OFFRES ET RECOMMANDATION POUR L'ATTRIBUTION DU MARCHE

Ont signé,


Lomé, le 11 AOUT 2017



Prof TONA Kokou



AFO SABI Kasséré



SOEDJEDE Yawovi Agbelenko



BALAWIA Atawa N




COUCHORO Mawuli



FOFANA Abdel-Nazir



OSSEYI Elolo Sayo



KULO Abalo



TETEH Ayivi



P'KLA Abalo

R

UCC

Annexe 1 : PV d'ouverture



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie



UNIVERSITE DE LOME

CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL
SUR LES SCIENCES AVIAIRES

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE D'OUVERTURE DES OFFRES

A. - IDENTIFICATION DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

Université de Lomé
BP 1515, Lomé-Togo
Téléphone : (+228) 22 20 08 27/22 40 60 58
Courriel: cersa.univ.lome@gmail.com

Objet de l'appel d'offres : Mise en place d'un mini-abattoir de volailles et accessoires au profit du CERSA

Avis d'appel d'offres : 02/2017/UL/PRMP/CERSA du 22 mars 2017

Organe et date de parution : Togo presse, 23 mars 2017

B. - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

La composition de la commission de passation des marchés publics a été fixée par décision n°010/UL/P/SG/2017 du 16 février 2017

Date de la réunion : Ce Mercredi 24 mai 2017.

Membres de la commission de passation des marchés publics de l'UL :

Nom et prénoms	Qualité	Signature	Absent mais convoqué le
ABOUDOU Maman Tachiwou			
P'KLA Abalo			
COUCHORO Mawuli Kodjovi			
AFO SABI Kasséré	CAMP		
NABEDE Piyabalo	Membre ERMP		

Le quorum est atteint :

Oui

Non

La commission peut, ~~ne peut pas~~, (rayer la mention inutile) valablement délibérer.

C. – REPRESENTANTS DU SERVICE TECHNIQUE BENEFICIAIRE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

Nom et prénoms	Qualité	Signature	Absent mais convoqué le
BALAWIA Atawa Nidakadila	SPM		
SOEDJEDE Yawovi Agbelenko	SGF		
TONA Agbewonannou	SC		

D. – SOUMISSIONNAIRES OU LEURS REPRESENTANTS / ET AUTRES¹ (sur présentation d'un titre justificatif)

Nom et prénoms	Qualité	Entreprise ou société représentée	Contact
BOUGALABOU Epiphonie	Technicienne biomédicale	STEA	
AHYEE Adélaïde	Analyste	Groupeement KAPI Consult - ENTOTRA	
ABDOULAYE Alion	TECHNICIEN Chimie - air	ECRO-BTP	0905 6994

Observateur indépendant / Personnes ressources :

Nom et prénoms	Qualité	Signature	Absent mais convoqué le

¹ Y compris l'observateur indépendant de l'ARMP ou toute personne ressource

E. - DECISION DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

N° d'ordre au registre spécial des dépôts	Nom du candidat ou des candidats groupés. Souligner le nom du mandataire	Pli ouvert (Oui/Non)	Décision d'examen										Commentaires		
			Contenu des plis ouverts (P=Document Présent ; M=Document Manquant)												
			Lettre de soumission datée et signée	Carte d'opérateur économique ou toute pièce équivalente	Extrait du registre du commerce et du crédit mobilier	Attestation de non faillite	Quitus fiscal	Attestation de l'inspection du travail et des lois sociales (ITLS)	Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale	Attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation	Garantie de soumission				
1	STEA	Oui	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
2	Groupeant Kappi Consult/ENTOTRA	Oui	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
3	ECRO-BTP	Oui	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
4															
5															
6															
7															
8															
9															

F. - LECTURE DU MONTANT DES OFFRES

N°	Nom du candidat ou des candidats groupés Souligner le nom du mandataire	Montant HT (F CFA)	Montant TTC (F CFA)	Rabais / Remise	Observations
1	<u>STEA</u>	94.866.853	111.242.887	Neant	
2	Groupement KAP. Consult / ENTOTRA	-	98.283.164	Neant	
3	<u>ECRO - BTP</u>	79.547.918	93.866.543	Neant.	
4					
5					
6					
7					
8					
9					

G. - INCIDENTS SURVENUS AU COURS DE LA SEANCE

NEANT

H. - ANNEXES

- Liste de présence des soumissionnaires et/ou leurs représentants dûment mandatés ;
- Les observations de l'observateur indépendant de l'ARMP, le cas échéant.

**I. - SIGNATURES DES MEMBRES DE LA COMMISSION /
REPRESENTANTS PRESENTS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE**

SOSSOU Ahmani Cicari 

AFO FABI Kassir 

BALAWI A Adama M.



TONA A. Fernand 

NABEAE Giyabeh 



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie



UNIVERSITE DE LOME

CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL
SUR LES SCIENCES AVIAIRES


MISE EN PLACE D'UN MINI-ABATTOIR DE VOLAILLES ET ACCESSOIRES AU PROFIT DU CERSA
(AOI N°02/2017/UL/ PRMP/CERSA DU 22/03/2017)

OUVERTURE DES OFFRES

Date : Mercredi 24 mai 2017

Liste de présence

N°	NOM ET PRENOMS	STRUCTURE REPRESENTEE	TELEPHONE	E-MAIL	SIGNATURE
01	GNAMASSOU Abidé	STEA	22 26 65 37 91940567	contact@stea-afrika-com	
02	Epiphane BOUGABOY	STEA	22244537	contact@stea-afrika-com	
03	AHYEE Adelaïde	Groupeement KAPI Consult - ENTOTRA	22 51 83 69 98 38 09 33	info@kapiconsult.com adelaide@kapiconsult.com	
04	ABOUCAYE Aïou	Eelo - BTP	90976994		

N°	NOM ET PRENOMS	STRUCTURE REPRESENTÉE	TELEPHONE	E-MAIL	SIGNATURE
05	DARLO Mahmoud	Kapi Circuit PAMP	91186984	mahmoud@live.fr	
06	SOSSOU A. GICAN	UL	90045880		
07	ARO SABI KASSIÉ	CPMP	90033805	arobaf@guil.com	
08	LOTOU-SEELA A. APELEDE	CPA-PRMP	91753245	ayawodetinsola@yahoo.fr	
09	BALAWIA ATAWA M.	LEESA	90080853	gildan..balawia@yahoo.fr	
10	TONA Agbenonansu F	CERSA	90153367	feunrandton@yahoo.fr	
11	BADJO Koussouwa	CPA-PRMP	91650736	badkouss@gmail.com	
12	KABEAE	CPMP	90088841	claudenabade@yahoo.fr	
13					
14					

Annexe2 : Conformité technique

Critères techniques		STE A	Groupe ment KAPI Consult/ENTOTRA	ECRO BTP
Convoyeur d'abattage de volailles en T galvanisé	10 mètres de circuit en T renversé galvanisé sur lesquels circulent des trolleys POMH munis de galets delrin à deux rangées de billes inox. Les Trolleys sont tractés par une chaîne calibrée cimentée	Conforme	Conforme	Conforme
	Crochets volailles, fil inox de 7 constitué de :	Conforme	Conforme	Conforme
	- 3 changements de direction 90°	Conforme	Conforme	Conforme
	- 1 descente de trempage	Conforme	Conforme	Conforme
	-1 ensemble groupe motorisation pour entraînement du convoyeur, moto réducteur variable 0,37 kW	Conforme	Conforme	Conforme
	- 1 coffret de mise en route	Conforme	Conforme	Conforme
Saignoir linéaire	Entièrement inox avec une longueur de 1m7, deux parties et goulotte d'évacuation du sang	Conforme	Conforme	Conforme
	OU variante sur demande auge à sang avec bas Largeur de la plateforme : 2 m.	Conforme	Conforme	Conforme

Critères techniques		STEA	Groupement KAPI Consult/ENTOTRA	ECRO BTP
Bac de trempage	Trempage par rideaux d'eau, longueur 2 m, niveau d'eau constant, toute tôlerie inox Chauffage électrique par 1 thermoplongeur de 15 kw, contrôle de température par thermomètre statop 4,	Conforme	Conforme	Conforme
	Vanne de vidange boisseau sphérique 50/60	Conforme	Conforme	Conforme
Plumeuse automatique	Entraînement par pignons caoutchouc à l'arrière, 2 moteurs de 1,8KW, doigts longs ronds	Conforme	Conforme	Conforme
	Rampe d'arrosage inox, diffuseurs individuels	Conforme	Conforme	Conforme
Armature	Armature en acier galvanisée. L'ensemble des éléments sont rattachés à l'armature permettant un transport et un nettoyage plus facile.	Conforme	Conforme	Conforme
Conforme pour l'essentiel (Oui/Non)		OUI	OUI	OUI

Annexe 3 : Demande de clarification et réponse

UNIVERSITE DE LOME



CABINET DU PRESIDENT

PERSONNE RESPONSABLE DES
MARCHES PUBLICS

N° 342/UL/CP/PRMP/2017

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

03-08-2017
ABAOU LAYE Aliou

La Personne Responsable 9075695
des Marchés Publics

à

Monsieur le Directeur Général d'ECRO-BTP

Tél : (+228) 90 17 69 80/96 16 66 52

Lomé - TOGO

Objet : Demande de clarifications
(AOI N°02/2017/UL/PRMP/CERSA)

Monsieur le Directeur Général,

Dans le cadre de l'évaluation des offres relatives à **la mise en place d'un mini-abattoir de volailles et accessoires au profit du CERSA**, objet de l'appel d'offres international n° 02/2017/UL/PRMP/CERSA du 22 mars 2017, et afin de permettre à la commission d'évaluation de finaliser le rapport d'examen des offres, je viens par la présente, vous demander de bien vouloir nous apporter le détail des travaux réalisées par vous en tant que sous-traitant de TK ENGINEERING sur le marché de construction de l'usine de production de poulet de chair à Avétonou.

Votre réponse est attendue dans les meilleurs délais et au plus tard dans les **sept (07) jours** suivants la date de réception de ce courrier.

Veuillez agréer, **Monsieur le Directeur Général**, l'expression de mes salutations distinguées.

Lomé, le 02 AOU 2017

La Personne Responsable,




Akuavi Cicavi SOSSOU



ECRO-BTP

Entreprise de construction
Et de réfection des ouvrages
En bâtiments et travaux publics

- AUTORISATION N° 037936/MDPRCPSP
- RCCM N° TOGO-LOME 2008A1864
- COE N° 084590Q

Tous travaux de Génie-civil, BTP, Études, Conseils, Architecture et Aménagements divers

OSBP : 284 LOME-TOGO, TEL : (00228) 90 17 69 80 / Cel : (00228) 96 16 66 32; Email : ecrobtp@gmail.com - Agoè Nyivé.

Lomé, le 09 aout 2017



A
La Personne Responsable des
Marchés Publics (PRMP) de
l'Université de Lomé- TOGO

Objet : Réponse à votre demande
de clarification

Monsieur la PRMP,

Dans le cadre de l'appel d'offres **AOI N° : 02/2017/UL/ PRMP/CERSA** auquel nous avons participé, et faisant suite à votre courrier référencé **N°342/UL/PRMP/2017**, nous avons l'honneur de vous adresser cette correspondance en vue de vous fournir autant que possible, les détails relatifs au projet de construction d'une usine de production de poulet de chair à Avétonou pour le compte de la Société Agro Business Company.

Nous avons eu en effet l'honneur de travailler en tant que sous-traitant, aux côtés du cabinet d'Etudes et de Contrôle TK Engineering qui avait en charge l'exécution de ce projet.

Au cours de ce projet où il était essentiellement question de construire un abattoir pour volailles et deux poulaillers modernes identiques, ECRO BTP a réalisé tous les travaux de gros œuvre pour ledit abattoir et les deux poulaillers pour un montant total hors taxes de Soixante-neuf millions deux cent quarante un mille cinq cent dix-neuf (69 241 519) Francs CFA, soit environ Quatre-vingt-et-un millions sept cent cinq mille (81 705 000) Francs CFA en TTC.


Nous vous prions de trouver ci-joints, quelques documents justificatifs conviction à défaut des pièces contractuelles officielles. Il s'agit des documents suivants :

- Situation financière faisant office de devis estimatif du gros œuvre de l'abattoir,
- Situation financière faisant office de devis estimatif du gros œuvre du poulailler N°1,
- Situation financière faisant office de devis estimatif du gros œuvre du poulailler N°2,
- Vue en plan de l'abattoir,
- Vue en plan du poulailler,
- Plans de fondation de l'abattoir.

Ces documents ci-dessus énumérés constituent les seules pièces contractuelles encore à notre possession à ce jour.

Espérant avoir répondu à vos préoccupations, nous vous prions d'agréer, PRMP, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur



Aboudoul-Ganiou TCHAKONDO



ECRO-BTP

Entreprise de construction
Et de réfection des ouvrages
En bâtiments et travaux publics

-AUTORISATION N° 037936/MDPRCPSP
- RCCM N° TOGO-LOME 2008A1864
-COE N° 084590Q

Tous travaux de Génie-civil, BTP, Études, Conseils, Architecture et Aménagements divers
05BP : 284 LOME-TOGO, TEL : (00228) 90 17 69 80 / Email : ecrobtp@gmail.com – AgoèNyivé non du college la source II

Lomé le 28 aout 2014

POUR TK ENGINEERING

SITUATION FINANCIERE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ABATTOIR D'AVETONOU Y COMPRIS DEUX POULAILLERS



**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ABATTOIR DES VOLAILLES ET DEUX POULAILLERS
MODERNES A AVETONOU**

ABATTOIR DE VOLAILLES

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX REALISES EN GROS ŒUVRE


Réf	Désignations	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
0	0/Installation et repli de chantier	Fft	1,00	1 200 000	1 200 000
	SOUS TOTAL 0				1 200 000
	1/TERRASSEMENTS				
1,1	Travaux préparatoires	m ²	2 263	200	452 600
1,2	Fouille en puits	m ³	120,90	1 500	181 350
1,3	Fouille en rigoles	m ³	179,8173	1 000	179 817
1,4	Remblai d'apport	m ³	1345,211	2 000	2 690 422
	SOUS TOTAL 1				3 504 189
	2/ BETONS - BETON ARME				
2,1	Béton de propreté (ép. 5 cm)	m ³	3,72	40 000	148 800
2,2	Béton armé pour semelles isolées	m ³	9,52	85 000	809 200
2,3	Béton armé pour longrine	m ³	17	85 000	1 411 000
2,4	Béton armé pour chaînage	m ³	16,60	85 000	1 411 000
2,5	Béton armé pour poteaux	m ³	6,32	85 000	537 200
2,6	Béton pour dallage au sol (ép 8 cm)	m ³	62,09	70 000	4 346 300
	SOUS TOTAL 2				8 663 373
	3/ MACONNERIE				
3.1	Maçonnerie de 15 pleins pour soubassement	m ²	442,6272	8 280	3 664 953
3.2	Maçonnerie de 12 creux pour mur en élévation	m ²	940,5828	6 042	5 683 001
	SOUS TOTAL 3				9 347 954
	4/ REVETEMENT				
4,1	Enduits verticaux	m ²	2766,42	1 895	5 242 366
4,2	Carrelage au sol, y compris plinthes	m ²	812,3064	6 500	5 279 992
4,3	Carréage grès cérame au sol	m ²	90,06	6 500	585 390
	SOUS TOTAL 4				11 107 748
	TOTAL HORS TAXE				33 823 264
	TOTAL TTC				

♦ COUT TOTAL DES TRAVAUX REALISES EN HORS TAXES: Trente trois millions huit cent vingt trois mille deux cent soixante quatre (33 823 264) FCFA

♦ Montant total perçu à ce jour par ECRO BTP: Trente trois millions deux cent mille deux cent soixante quatre (33 823 264) FCFA

♦ Montant restant dû à ECRO BTP: Six cent vingt trois mille (623 000) FCFA

Fait à Lomé, le 28 août 2014


Abdoul-Ganiou TCHAKONDO



**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ABATTOIR DES VOLAILLES ET DEUX POULLAILLERS
MODERNES A AVETONOU**

POULLAILLER N°1

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX REALISES EN GROS ŒUVRE

Réf	Désignations	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
I	INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER				
I-1	Installation et repli de chantier	ff	1	1000000	1 000 000
I-2	Nétoyage et implantation	m ²	1776	180	319 680
	sous total 1				1 319 680
II-	TERRASSEMENT				
II-1	Fouilles en puits en terrain meubles	m3	52,8	1 500	79 200
II-2	Fouille en rigole en terrain meubles	m3	66,96	1 000	66 960
II-3	Remblai dans les fouilles	m3	84,9	3 000	254 700
II-4	Remblai d'apport en sable silteux	m3	388,5	3 900	1 515 150
	Sous total 2				1 916 010
III-	BETON - BETON ARME				
III-1	Béton de propreté dosé à 150Kg/m3	m3	7,78	40 000	311 200
III-2	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les massifs	m3	31,4715	85000	2 675 078
III-3	Béton armé pour longrine	m3	13,8	85000	1 173 000
III-4	Dallage au sol	m3	84	70 000	5 880 000
III-5	Béton amé pour chainage des murs pignons	m3	0,6	90 000	54 000
	Sous total 3				10 093 278
IV-	MACONNERIE				
IV- 1	Maçonnerie en agglos de 15 pleins	m2	396	8 000	3 168 000
IV- 2	Maçonnerie en aglos creux de 12 pour élévation des murs pignon	m ²	56	6 000	336 000
IV- 3	Enduit en mortier sur maçonnerie	m2	473,6	1 850	876 160
	Sous total 4				4 380 160
	TOTAL HT GROS ŒUVRE				17 709 128
	TOTAL TTC GROS ŒUVRE				20 896 770

♦ **COUT TOTAL DES TRAVAUX REALISES EN HORS TAXES: Dix-sept millions sept cent neuf mille cent vingt-huit (17 709 128) FCFA**

♦ **Montant total perçu à ce jour par ECRO BTP: Seize millions trois cent neuf mille (16 300 000) FCFA**

♦ **Montant restant dû à ECRO BTP: Un million quatre cent neuf mille (1 409 000) FCFA**

Fait à Lomé, le 28 août 2014

Abdoul-Ganiou TCHAKONDO



**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ABATTOIR DES VOLAILLES ET DEUX
POULAILLERS MODERNES A AVETONOU**

POULLAILLER N°2

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX REALISES EN GROS ŒUVRE


Réf	Désignations	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
I	INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER				
I-1	Installation et repli de chantier	ff	1	1000000	1 000 000
I-2	Nétoyage et implantation	m ²	1776	180	319 680
	sous total 1				1 319 680
II-	TERRASSEMENT				
II-1	Fouilles en puits en terrain meubles	m3	52,8	1 500	79 200
II-2	Fouille en rigole en terrain meubles	m3	66,96	1 000	66 960
II-3	Remblai dans les fouilles	m3	84,9	3 000	254 700
II-4	Remblai d'apport en sable silteux	m3	388,5	3 900	1 515 150
	Sous total 2				1 916 010
III-	BETON - BETON ARME				
III-1	Béton de propreté dosé à 150Kg/m3	m3	7,78	40 000	311 200
III-2	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les massifs	m3	31,4715	85000	2 675 078
III-3	Béton armé pour longrine	m3	13,8	85000	1 173 000
III-4	Dallage au sol	m3	84	70 000	5 880 000
III-5	Béton armé pour chaînage des murs pignons	m3	0,6	90 000	54 000
	Sous total 3				10 093 278
IV-	MACONNERIE				
IV- 1	Maçonnerie en agglos de 15 pleins	m2	396	8 000	3 168 000
IV- 2	Maçonnerie en aglos creux de 12 pour élévation des murs pignon	m ²	56	6 000	336 000
IV- 3	Enduit en mortier sur maçonnerie	m2	473,6	1 850	876 160
	Sous total 4				4 380 160
	TOTAL HT GROS ŒUVRE				17 709 128
	TOTAL TTC GROS ŒUVRE				20 896 770

♦ **COUT TOTAL DES TRAVAUX REALISES EN HORS TAXES: Dix-sept millions sept cent neuf mille cent vingt-huit (17 709 128) FCFA**


♦ **Montant total perçu à ce jour par ECRO BTP: Quinze millions cinq cent mille (15 500 000) FCFA**

♦ **Montant restant dû à ECRO BTP: Deux million deux cent neuf mille (2 209 000) FCFA**


Fait à Lomé, le 28 août 2014



Abdoul-Ganiou TCHAKONDO




PLAN DE FONDATION

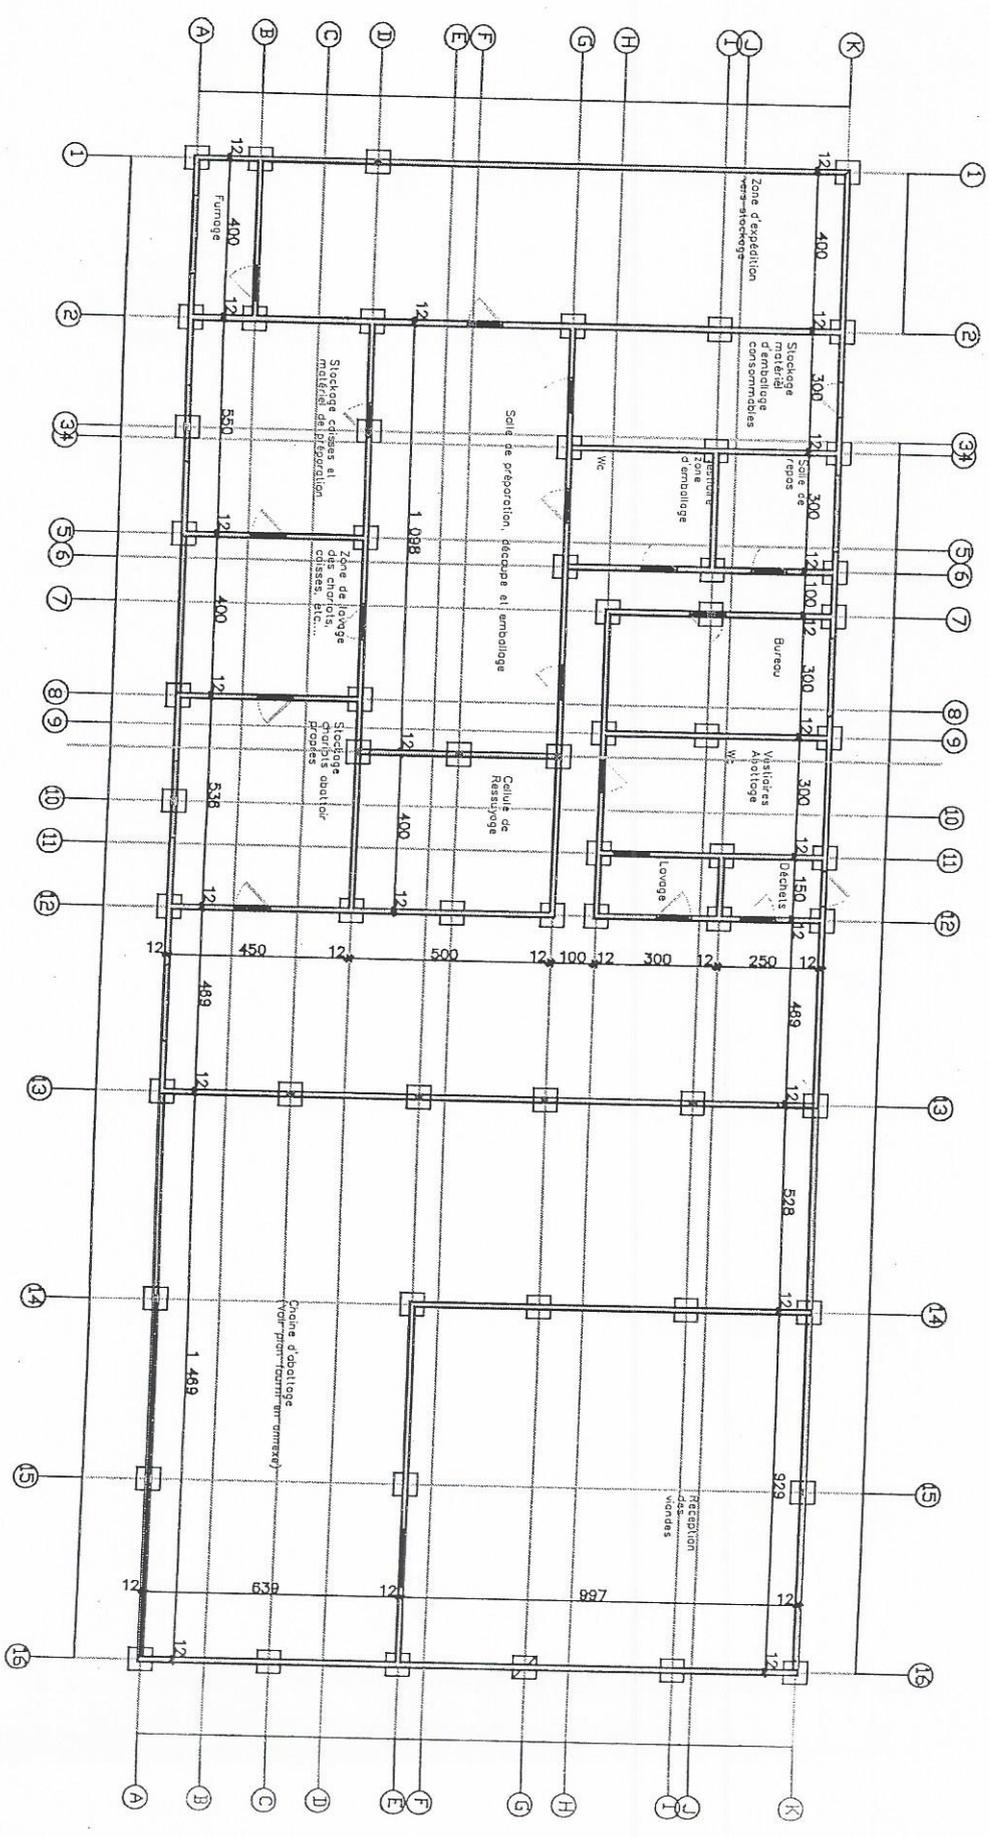

Soubassement aggrlos plein de 15x20x40
 Fouille en rigole 60x60

□ Semelle 80 x 80 x 20
 Fouille en en puit 80 x 120

*Poteau 15 x 15
 Longrine 15 x 20

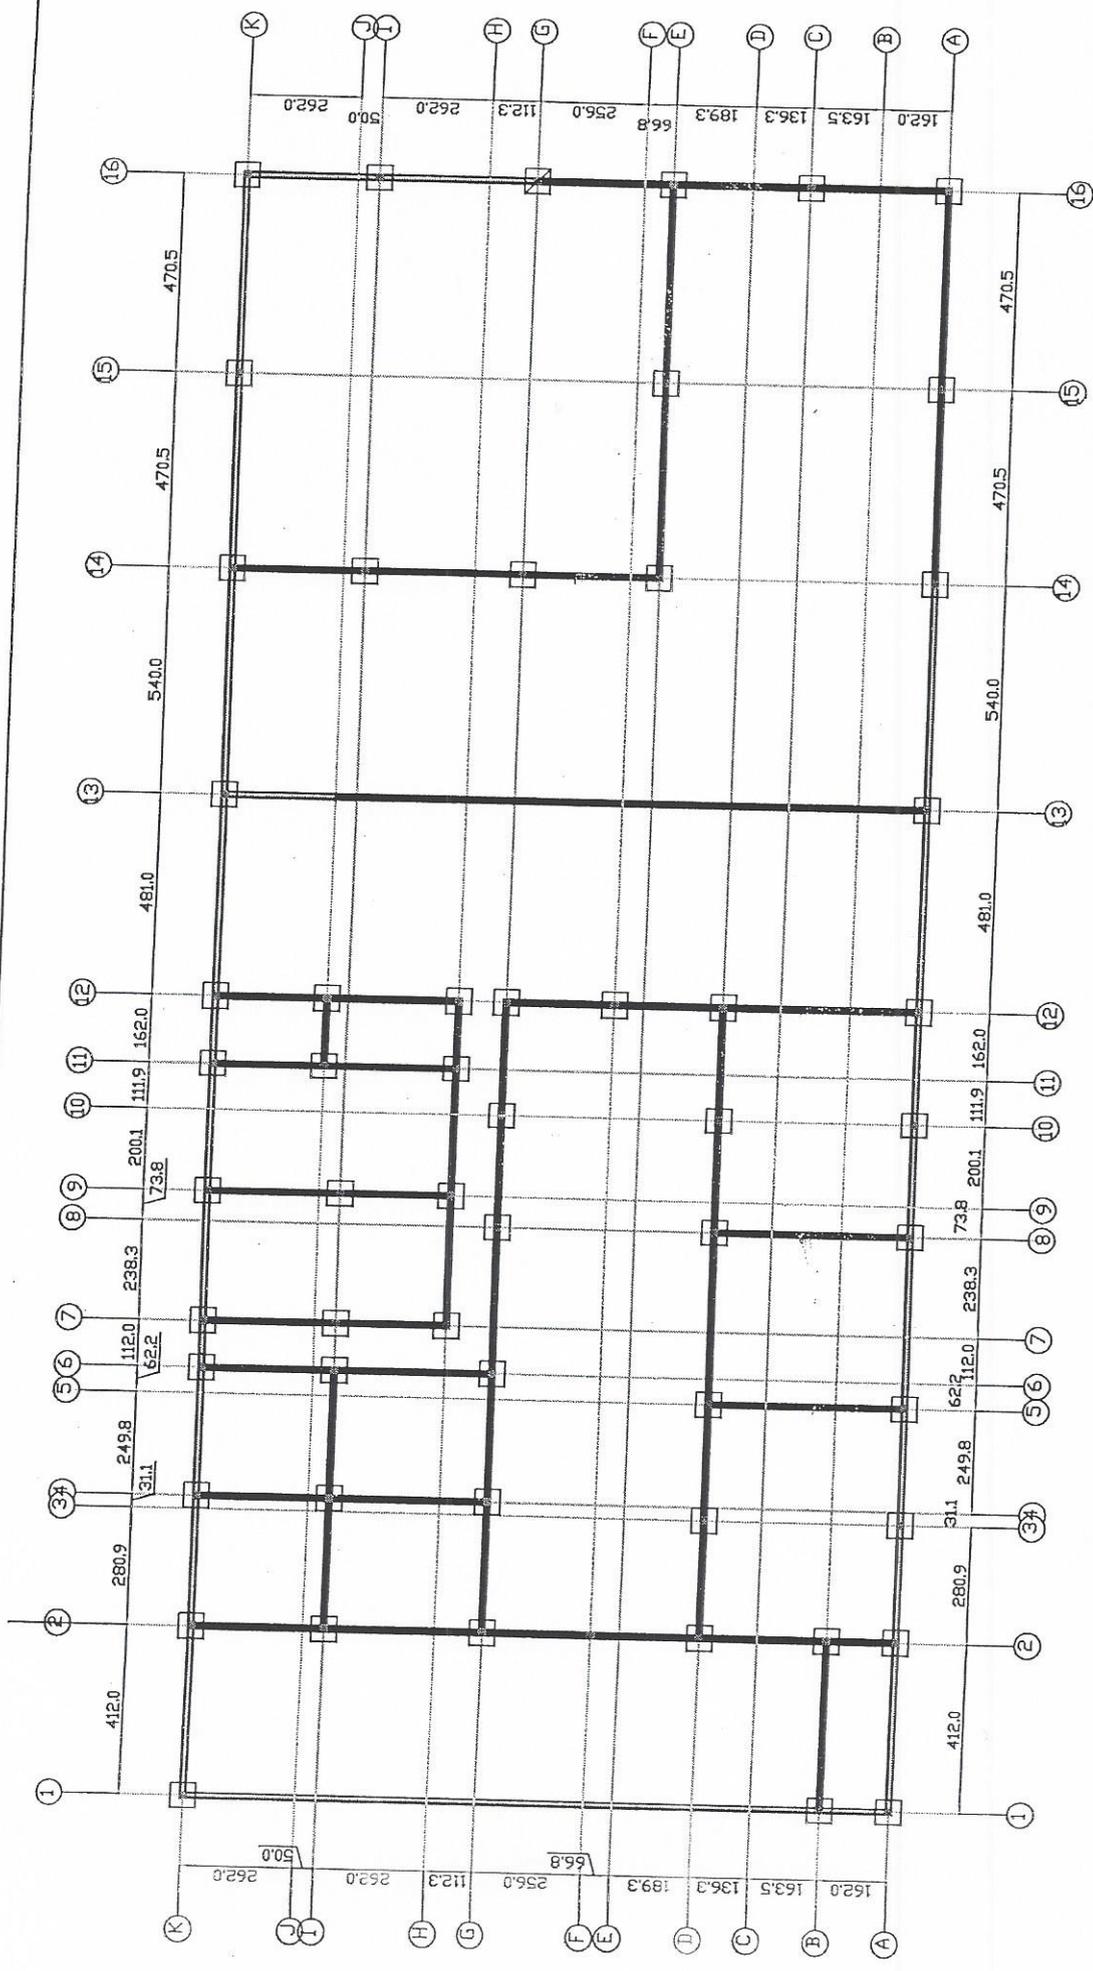

Soubassement agglomeres plein de 15x20x40
 Fouille en rigole 60x60

□ Semelle 60 x 60 x 25
 Fouille en puit 80 x 120

■ Poteau 15 x 15
 Longrine 15 x 20

